

嵊州市欧彩电器有限公司年产 240 万只搪瓷锅架

生产线项目竣工环境保护自行验收意见

嵊州市欧彩电器有限公司依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范，对照项目环境影响评价报告和备案文件，组织召开年产 240 万只搪瓷锅架生产线项目自行竣工环境保护验收会议。参加会议的有编制单位浙江正诺检测科技有限公司、建设单位嵊州市欧彩电器有限公司、环保设施设计施工单位嵊州市亚广环保科技有限公司。

会议分别听取了建设单位嵊州市欧彩电器有限公司关于先行项目竣工环境保护执行情况工作总结、企业污染治理和运行工作介绍、验收编制单位浙江中诺检测技术有限公司关于该项目竣工验收监测报告主要内容的介绍，验收小组进行了现场踏勘，查阅了竣工环境保护验收监测报告和相关验收资料，经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

嵊州市欧彩电器有限公司成立于 2020 年 5 月，租用浙江博德电器有限公司位于嵊州市经济开发区浦南一路 96 号的闲置厂房第一层进行生产。2021 年 7 月建设完成，项目建成投产后，形成年产 240 万只搪瓷锅架的生产能力。

2021 年 8 月 12 日、13 日验收报告编制单位对该公司建设项目环保措施落实情况 and 环保设施建设、运行情况进行了检查，在此基础上编写了本竣工环境保护验收监测报告。

（二）建设过程及环保审批情况

企业委托河北征耀环保科技有限公司于 2021 年 8 月编制了《嵊州市欧彩电器有限公司年产 240 万只搪瓷锅架生产线项目环境影响登记表》，并于 2020 年 9 月 23 日通过绍兴市生态环境局《嵊州市“区域环评+环境标准”改革建设项目环境影响登记表备案通知书》（嵊

环备[2020]33号)

(三) 投资情况

项目实际总投资 400 万元，其中环保总投资为 5 万元。

(四) 验收范围

嵊州市欧彩电器有限公司年产 240 万只搪瓷锅架生产线项目及配套的环保设备。

二、工程变动情况

先行项目实际实施的生产工艺、产品方案、污染防治措施均在环评审批范围内。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

项目产生的废水为去毛刺(湿抛)废水和员工生活污水，湿抛收集后汇入湿抛车间内专用沉淀池，经三级沉淀除渣处置后循环使用，生活污水经化粪池处理后纳入市政截污管网，送嵊新首创污水处理有限公司处理。

(二) 废气

项目本新建项目废气主要为烧结工序采用搪瓷炉，烧结废气和烟尘以及颗粒物，烧结废气和烟尘、布袋除尘器处理后经 15m 排气筒排放，抛光粉尘、抛光机自带粉尘处理系统，处理后通过 15 米高空排放，配釉粉尘、焊接烟尘通过车间通风无组织排放。

(三) 噪声

项目噪声来源于研磨机、冲压机、伺服打圈机、抛光机噪声。通过作业期间关闭门窗，设备定期维护、保养等措施，确保厂界噪声达标排放。

(四) 固废

项目产生的固废为的一般废物主要有废包装材料、废边角料、沉渣、员工生活垃圾，危险废物有废皂化液、废液压油、废包装桶。

边角料、废包装材料收集后出售给物资公司回收利用，废液压油委托嵊州市新业危险废物经营有限公司暂存，生活垃圾由当地环卫部

门统一清运。

四、环境保护设施调试效果

根据浙江正诺检测科技有限公司提供的验收资料显示的环境保护设施调试效果如下：

1、废水监测结论

监测时段，废水中的 pH 值，化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准相关排放要求，氨氮、总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）中“其他企业”限值。

2、废气监测结论

监测时段，项目塑封处理设施出口排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）大气污染物特别排放限值要求。

3、噪声监测结论

监测时段，项目厂界四侧噪声符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）。

4、固体废物治理设施

项目固废均按环保要求进行了处置。

5、总量控制

经核算，先行项目废水、废气污染物排放量在环评批复的总量控制范围内。

五、项目建设对环境的影响

验收监测报告结论与《嵊州市欧彩电器有限公司年产 240 万只搪瓷锅架项目环境影响登记表》影响评价结论基本一致。

六、验收结论

嵊州市欧彩电器有限公司年产 240 万只搪瓷锅架自行项目在建设及实际运行过程中基本执行环保“三同时”规定，验收资料基本齐全，环境保护措施基本落实，监测指标达到排放标准要求，排放总量在总量控制范围内。该项目基本符合环保竣工验收要求。验收组经讨

论同意先行项目通过竣工环境保护验收。

七、存在问题及建议要求

1、加强污水处理设施及管网的运行维护工作，确保生活污水全部纳管排放。

2、加强对废气处理设施的运行维护工作，定期更换活性炭并做好相关记录台账，确保废气稳定达标排放。按相关规范要求设置规范的废气排放口。


3、加强设备的运行和维护，确保厂界噪声达标排放。

4、企业需严格按照环评中的要求做好固废防治工作，规范危险废物暂存场所设置，废活性炭需密封暂存；加强危险废物的台帐管理、周知卡、标识标签和处理处置工作；做好一般工业固体废物和生活垃圾的及时处置，防治二次污染事故发生。

5、加强企业环境管理工作，建立相应的环境管理制度和责任制度，完善标识标牌和操作规程并上墙。

6、需进一步规范废气无组织排放点位的设置，补充项目液压油的用量及液压油包装桶的合法处置情况资料，完善验收监测报告及附图、附件等验收相关材料。

企业法人：

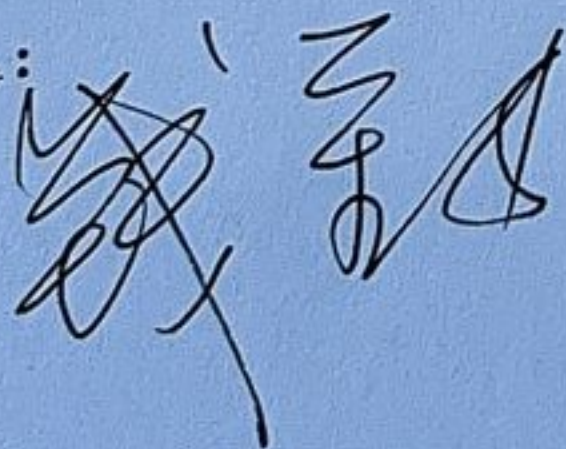

嵊州市欧彩电器有限公司

2021年11月6日
